

Ofício nº 13/2022/MT

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de Outubro de 2022.


**Ao Ilmo. Sr. Presidente
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos
Sr. Sérgio Silveira Lima**

SOLICITAÇÃO DE 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 002/022/CMSJQM

PLANTAE Serviços e Projetos LTDA, com firma estabelecida na Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE, CNPJ 19.568.425/0001-20, representada neste ato pelo sócio o Sr. João Pinto dos Santos, inscrito no CPF sob nº 015.546.845-60, vem por meio deste **SOLICITAR A 2ª Medição do contrato nº 002/2022/CMSJQM**, para tanto encaminhamos anexo Planilha da 2ª Medição.

Desde já antecipamos os nossos agradecimentos;

Nestes termos p. Deferimento;

Câmara Municipal de S. J. dos Quatro Marcos	
PROTOCOLO Nº <u>1280/2022</u>	
Data <u>13/10/22</u>	Horas <u>16:13</u>
	
Ass. Responsável	


João Pinto dos Santos

Proprietário

Ofício nº 13/2022/MT

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de Outubro de 2022.


**Ao Ilmo. Sr. Presidente
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos
Sr. Sérgio Silveira Lima**

SOLICITAÇÃO DE 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 002/022/CMSJQM

PLANTAE Serviços e Projetos LTDA, com firma estabelecida na Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE, CNPJ 19.568.425/0001-20, representada neste ato pelo sócio o Sr. João Pinto dos Santos, inscrito no CPF sob nº 015.546.845-60, vem por meio deste **SOLICITAR A 2ª Medição do contrato nº 002/2022/CMSJQM**, para tanto encaminhamos anexo Planilha da 2ª Medição.

Desde já antecipamos os nossos agradecimentos;

Nestes termos p. Deferimento;

Câmara Municipal de S. J. dos Quatro Marcos	
PROTOCOLO Nº <u>1.280/2022</u>	
Data <u>13/10/2022</u>	Horas <u>16:13</u>
	
Ass. Responsável	


João Pinto dos Santos

Proprietário

Rua Guilherme Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE plantae@plantaese@yahoo.com –
 Telefone/WhatsApp (79) 99877-0082 CNPJ nº: 19.568.425/0001-20

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos


Proprietário: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO				2ª Medição		Medição Acumulada		BASE DE PREÇOS REAJUSTADA		BDI	
				Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	COMP.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²												
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS													
		DEMOLIÇÃO ALVENARIA E ESQUADRIAS													
2.1	COMP.002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	42,98	57,18	2.457,81	0,18%	42,98	2.457,81	59,49	3.378,34				
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	21,00	9,28	194,85	0,01%	21,00	194,85	28,56	263,25				
2.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,74	35,27	696,17	0,05%	19,74	696,17	29,30	1.007,36				
2.4	COMP.003	DEMOLIÇÃO DE PISOS	m³	29,40	16,76	492,81	0,04%	29,40	492,81	31,55	527,94				
2.16	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	15,36	275,04	4.224,65	0,31%	15,36	4.224,65	15,36	4.224,65				
2.17	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,12	276,69	309,90	0,02%	1,12	309,90	1,12	309,90				
2.18	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M [ACERTO DO SOLO NATURAL]. AF_08/2020	m²	227,07	6,19	1.406,47	0,10%	227,07	1.406,47	227,07	1.406,47				
2.19	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKM). AF_07/2020 (Bota fora)	TKM	8.970,00	2,31	20.756,58	1,50%	8.970,00	20.756,58	8.970,00	20.756,58				
		CAIÇADAS													
2.5	COMP.003	DEMOLIÇÃO DE PISOS	m³	25,67	55,57	1.426,73	0,10%	25,67	1.426,73	26,86	1.446,18				
		RETIRADA DE COBERTURA													
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	229,22	7,42	1.700,90	0,12%	229,22	1.700,90	229,22	1.700,90				
2.7	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	2,00	82,26	164,53	0,01%	2,00	164,53	2,00	164,53				
2.8	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	6,00	343,26	2.059,54	0,15%	6,00	2.059,54	9,00	2.750,57				
2.9	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	70,41	37,80	2.661,82	0,19%	70,41	2.661,82	104,31	3.460,26				
2.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	249,96	3,46	864,34	0,06%	249,96	864,34	333,51	1.146,03				
2.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	227,40	1,61	366,58	0,03%	227,40	366,58	310,95	497,91				
		RETIRADA DE INSTALAÇÕES E COMPONENTES ELÉTRICOS													
2.12	COT.001	RETIRADA DE INSTALAÇÕES E COMPONENTES ELÉTRICOS DE EDIFICAÇÃO COM ÁREA SUPERIOR A 300 M² E INFERIOR A 800 M²	unid	0,80	959,87	767,89	0,06%	0,80	767,89	1,00	959,87				



Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Propri: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

		BASE DE PREÇOS				BASE DE PREÇOS REAJUSTADA				BDI	
		SINAPI 03/2022 Não Desonerado				SINAPI 09/2022 Não Desonerado				23,06%	
		2ª Medição				Medição Acumulada					
		Quant.	Valor TOTAL	%	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Valor TOTAL
Item	Código	Unid.	Descrição	Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Valor TOTAL
2,13	COT. 002	unid	RETRADA DE AR CONDICIONADO COM MOTOR E CONDENSADOR DE 12.000 A 30.000 BTU'S.	10,00	395,95	3.959,46	0,29%	3.959,46	10,00	3.959,46	
			EQUIPAMENTOS DE BANHEIROS E COZINHA			113,72	0,01%	113,72		134,58	
2,14	97663	unid	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	7,00	12,38	86,65	0,01%	86,65	8,00	98,72	
2,15	97666	unid	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	3,00	9,02	27,06	0,00%	27,06	4,00	35,86	
3,0			CANTEIRO DE OBRA			11.108,10	0,80%	11.108,10		31.533,29	
3,1	93584	m²	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_04/2016	6,00	126,50	759,02	0,05%	759,02	6,00	6.214,91	
3,2	98459	m²	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	6,00	126,50	759,02	0,05%	759,02	50,00	6.253,69	
3,3	99059	m	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEIRADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	157,35	65,77	10.349,08	0,75%	10.349,08	301,85	19.064,70	
4,0			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO			140.823,74	10,18%	78.232,16		108.637,98	62.591,58
			FUNDAÇÃO			55.071,11	3,98%	33.327,30		63.733,12	21.743,81
4,1	96527	m³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	11,49	130,96	1.504,71	0,11%	1.504,71	21,12	2.734,33	
4,2	96523	m³	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	12,44	99,73	1.240,59	0,09%	1.240,59	26,24	2.582,43	
4,3	96616	m³	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_08/2017	0,62	787,58	488,30	0,04%	488,30	1,31	951,31	
4,4	96536	m²	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	42,20	87,05	3.672,96	0,27%	3.672,96	78,41	6.588,62	
4,5	96543	kg	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	183,33	25,64	4.701,17	0,34%	3.365,67	301,42	7.222,56	1.335,50
4,6	96545	kg	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	402,98	23,85	9.609,43	0,69%	5.914,51	612,95	13.248,39	3.694,93
4,7	96546	kg	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	120,82	21,57	2.606,02	0,19%	1.801,48	206,20	4.010,89	804,54
4,8	96548	kg	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_06/2017						13,50	195,35	
4,9	96557	m³	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	12,03	988,87	11.896,14	0,86%	5.023,47	15,92	15.088,59	6.872,67

Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE plantae@yahoocom.com –
 Telefone/WhatsApp (79) 99877-0082 CNPJ nº: 19.568.425/0001-20

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Propri: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO				2ª Medição		Medição Acumulada		SAÍDO ATUAL		BDI
				Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	
4,10	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃO. AF_06/2018	m²	175,55	30,34	5.326,56	0,39%	98,05	2.975,05	117,50	3.460,22	77,50	2.351,51	
4,11	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	12,70	30,72	390,08	0,03%	12,70	390,08	22,90	699,96			
4,20	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (Terra para reaterro base contrapiso)	TXKM	2.479,30	2,31	5.737,10	0,41%	1.390,05	3.216,58	1.390,05	3.216,58	1.089,25	2.520,52	
4,21	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Base para contrapiso)	m³	153,35	51,50	7.898,04	0,57%	72,50	3.733,90	72,50	3.733,90	80,85	4.164,14	
		SUPERESTRUTURA				85.752,63	4,20%		44.904,86		44.904,86		40.847,77	
4,12	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	118,84	116,22	13.810,95	1,00%	57,77	6.714,00	57,77	6.714,00	61,07	7.096,95	
4,13	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	635,10	25,68	16.309,59	1,18%	338,03	8.680,73	338,03	8.680,73	297,07	7.628,86	
4,14	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	0,40	24,96	9,98	0,00%	0,40	9,98	0,40	9,98			
4,15	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	542,40	23,85	12.937,89	0,94%	289,17	6.897,59	289,17	6.897,59	253,23	6.040,31	
4,16	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	713,60	21,50	15.339,21	1,11%	398,75	8.571,34	398,75	8.571,34	314,85	6.767,87	
4,17	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	47,30	17,40	822,94	0,06%	26,96	469,06	26,96	469,06	20,34	353,88	
4,18	103672	DENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A	m³	13,83	941,55	13.021,59	0,94%	7,53	7.089,85	7,53	7.089,85	6,30	5.931,74	
4,19	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	14,33	942,11	13.500,48	0,98%	6,87	6.472,32	6,87	6.472,32	7,46	7.028,16	
5,0		ALVENARIAS				275.946,64	19,95%		84.434,12		84.434,12		191.512,51	

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO				2ª Medição		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
				Quant.	P.Unif C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos													
Propri: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos													
Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro													
Data: 07/10/2022													
		AMBIENTES				275.768,51	19,94%			84.434,12		191.334,38	
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.086,52	107,87	117.198,96	8,47%	533,27	57.521,895	533,27	57.521,895	553,25	59.677,06
5.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	2.173,04	5,06	10.989,51	0,79%	917,30	4.638,98	917,30	4.638,98	1.255,74	6.350,53
5.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.173,04	26,74	58.104,72	4,20%	283,50	7.580,48	283,50	7.580,48	1.889,54	50.524,24
5.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.173,04	37,85	82.247,39	5,95%	283,50	10.730,19	283,50	10.730,19	1.889,54	71.517,20
5.6	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021	kg	114,90	23,63	2.715,09	0,20%	57,95	1.369,36	57,95	1.369,36	56,95	1.345,73
5.7	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	2,36	1.102,84	2.602,71	0,19%	1,31	1.444,72	1,31	1.444,72	1,05	1.157,99
5.8	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	m³	1,58	1.208,94	1.910,13	0,14%	0,95	1.148,50	0,95	1.148,50	0,63	761,63
		COZINHA				178,13	0,01%					178,13	
5.4	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8,32	21,41	178,13	0,01%					8,32	178,13
6.0		PISO				71.138,46	5,14%					71.138,46	
		AMBIENTES				71.003,70	5,13%					71.003,70	
6.1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	485,42	39,83	19.334,73	1,40%					485,42	19.334,73
6.2	COMP. 004 AF_09/2020	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.	m²	485,42	41,27	20.034,14	1,45%					485,42	20.034,14
6.3	COT.003	RODAPÉ EM GRANILITE PARA AMBIENTES INTERNOS - ALTURA DE 10 CM	m	479,52	14,40	6.904,14	0,50%					479,52	6.904,14
6.5	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	485,42	50,95	24.730,69	1,79%					485,42	24.730,69

Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE plantae@yaho.com -
Telefone/WhatsApp (79) 99877-0082 CNPJ nº: 19.568.425/0001-20

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Proprietário: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO				2ª Medição		Medição Acumulada		BASE DE PREÇOS REAJUSTADA		BDI	
				Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
7.13	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	36,70	40,56	1.488,45	0,11%	25,00	1.013,93	25,00	1.013,93	11,70			474,52
7.14	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	49,56	70,42	3.490,06	0,25%	7,00	492,95	7,00	492,95	42,56			2.997,11
7.15	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	42,98	140,89	6.055,46	0,44%					42,98			6.055,46
7.16	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid	4,00	128,15	512,60	0,04%					4,00			512,60
7.17	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid	1,00	50,04	50,04	0,00%					1,00			50,04
7.18	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid	7,00	245,64	1.719,49	0,12%					7,00			1.719,49
7.19	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	unid	10,00	82,50	825,05	0,06%					10,00			825,05
7.20	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201	unid	2,00	51,69	103,38	0,01%					2,00			103,38
7.21	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	unid	7,00	675,36	4.727,55	0,34%					7,00			4.727,55
		FORRO				45.081,42	3,26%								45.081,42
7.22	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	460,28	97,94	45.081,42	3,26%					460,28			45.081,42
8.0		ESQUADRIAS				126.511,07	9,15%								126.511,07
		PORTAS				68.502,54	4,95%								68.502,54
8.1	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	2,00	1.402,32	2.804,63	0,20%					2,00			2.804,63

Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE plantaese@yahoo.com -
Telefone/WhatsApp (79) 99877-0082 CNPJ nº: 19.568.425/0001-20

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Propri: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO				2ª Medição		Medição Acumulada		BASE DE PREÇOS REAJUSTADA		BDI	
				Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
8,2	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	21,00	1.115,53	23.426,08	1,69%					21,00	23.426,08		
8,3	COT. 004	PORTA DE VIDRO DE TEMPERADO DE 8 MM, INCOLOR DE ABRIR, 100X210CM, INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E BATENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	1.461,20	1.461,20	0,11%					1,00	1.461,20		
8,4	COT. 005	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM DE CORRER DE 2 FOLHAS, 150X210CM, SENDO UMA FOLHA FIXA DE 0,75 M E UMA FOLHA DE CORRER COM 0,75 M. INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E BATENTES.	unid	4,00	1.878,55	7.514,18	0,54%					4,00	7.514,18		
8,5	COT. 006	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, DE CORRER, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	1.439,80	1.439,80	0,10%					1,00	1.439,80		
8,6	COT. 007	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM DE CORRER DE 4 FOLHAS, 250X300CM, SENDO DUAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER. INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E BATENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	2,00	4.551,72	9.103,44	0,66%					2,00	9.103,44		
8,7	COT. 008	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 8MM DE ABRIR 4 FOLHAS, 200X300CM, SENDO DUAS FIXAS E DUAS DE ABRIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	5.399,26	5.399,26	0,39%					1,00	5.399,26		
8,8	COT. 009	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 2 FOLHAS, MEDINDO 160X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	2.723,63	2.723,63	0,20%					1,00	2.723,63		
8,9	COT. 010	PORTÃO METÁLICO BASCULANTE PARA GARAGEM, MEDINDO 350X 240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	12.070,34	12.070,34	0,87%					1,00	12.070,34		
8,10	COT. 011	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM DE CORRER DE 4 FOLHAS, 180X210CM, SENDO DUAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER. INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E BATENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	2.559,99	2.559,99	0,19%					1,00	2.559,99		
		BANHEIROS				4.877,60	0,35%						4.877,60		
8,10	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,08	802,24	4.877,60	0,35%					6,08	4.877,60		
		JANELAS				53.130,93	3,84%						53.130,93		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO												
Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO			2º Medição		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
				Quant.	P.Unít C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.
8,11	COT. 012	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 0,6 M X 0,4 M, FUME, BASCULANTE, INCLUSO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	370,26	740,51	0,05%				2,00	740,51
8,12	COT. 013	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,60 M X 0,60 M, FUME, QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E AS OUTRAS DUAS DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	950,71	1.901,43	0,14%				2,00	1.901,43
8,13	COT. 014	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,30 M X 0,60 M, FUME, QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E AS OUTRAS DUAS DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	901,94	901,94	0,07%				1,00	901,94
8,14	COT. 015	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,20 M X 1,00 M, FUME, MAXIM AR, INCLUSO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	875,96	1.751,93	0,13%				2,00	1.751,93
8,15	COT. 016	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,00 M X 1,00 M, FUME, MAXIM AR, INCLUSO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	1.175,84	4.703,35	0,34%				4,00	4.703,35
8,16	COT. 017	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,30 M X 1,50 M, FUME, MAXIM AR, INCLUSO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	1.079,85	1.079,85	0,06%				1,00	1.079,85
8,17	COT. 018	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,50 M X 1,00 M, FUME,DUAS FOLHAS, SENDO UM FOLHA FIXA E A OUTRA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00	1.115,85	3.347,54	0,24%				3,00	3.347,54
8,18	COT. 019	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,00 M X 1,50 M, FUME,DUAS FOLHAS, SENDO UM FOLHA FIXA E A OUTRA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	1.439,80	2.879,60	0,21%				2,00	2.879,60
8,19	COT. 020	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,80 M X 1,50 M, FUME,DUAS FOLHAS, SENDO UM FOLHA FIXA E A OUTRA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	1.259,83	1.259,83	0,09%				1,00	1.259,83
8,20	COT. 021	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 3,00 M X 1,00 M, FUME, QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E AS OUTRAS DUAS DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	2.159,70	2.159,70	0,16%				1,00	2.159,70
8,21	COT. 022	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,00 M X 2,40 M, FUME, UMA FOLHA FIXA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	2.639,64	10.558,55	0,76%				4,00	10.558,55
8,22	COT. 023	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,00 M X 1,50 M, FUME,DUAS FOLHAS, SENDO UM FOLHA FIXA E A OUTRA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	1.439,80	2.879,60	0,21%				2,00	2.879,60
8,23	COT. 024	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 8,00 M X 4,00 M, FUME, UMA FOLHA FIXA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	18.967,09	18.967,09	1,37%				1,00	18.967,09

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos Propr.: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro Data: 07/10/2022						PLANILHA DE MEDIÇÃO							
Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO				2ª Medição		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
				Quant.	P.Unif C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
9.0		PINTURA E REVESTIMENTO				41.259,33	2,98%						41.259,33
		AMBIENTES				39.585,51	2,86%						39.585,51
9.1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1.086,52	2,79	3.034,82	0,22%					1.086,52	3.034,82
9.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.086,52	14,25	15.481,86	1,12%					1.086,52	15.481,86
9.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.086,52	19,39	21.068,83	1,52%					1.086,52	21.068,83
		COZINHA - PAREDE JANELA				645,22	0,05%						645,22
9.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	8,32	77,55	645,22	0,05%					8,32	645,22
		PINTURA DE ESQUADRIAS				1.028,60	0,07%						1.028,60
9.5	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO [RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA] EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	78,54	9,71	762,53	0,06%					78,54	762,53
9.6	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS [EXCETO PERFIL] EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	23,20	11,47	266,07	0,02%					23,20	266,07
10.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				97.714,38	7,06%						96.463,42
		COMPONENTES ELÉTRICOS				41.618,48	3,01%						40.367,52
10.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOTÊNCIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	1,00	179,71	179,71	0,01%					1,00	179,71
10.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	unid	1,00	99,73	99,73	0,01%					1,00	99,73
10.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	unid	1,00	70,59	70,59	0,01%					1,00	70,59
10.4	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM.	unid	1,00	1.639,45	1.639,45	0,12%					1,00	1.639,45
10.5	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	114,44	14,38	1.646,18	0,12%					114,44	1.646,18

Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE plantae@ychoo.com -
Telefone/WhatsApp: (79) 99877-0082 CNPJ nº: 19.568.425/0001-20

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Propri: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

		BASE DE PREÇOS				BASE DE PREÇOS REAJUSTADA				BDI			
		SINAPI 03/2022				SINAPI 09/2022				23,06%			
		Não Desonerado				Não Desonerado							
		2ª Medição				Medição Acumulada				SAÍDO ATUAL			
		Quant.	Valor TOTAL	%	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	
Item	Código	Unid.	Descrição										
10.6	91834	m	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		551,53	10,88	5.999,47	0,43%	115,00	1.250,96	115,00	1.250,96	4.748,52
10.7	97667	m	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016		7,70	11,64	89,62	0,01%			7,70	89,62	89,62
10.8	91840	m	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		15,83	16,77	265,48	0,02%			15,83	265,48	265,48
10.9	97668	m	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016		20,08	16,60	333,26	0,02%			20,08	333,26	333,26
10.10	91864	m	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		6,13	18,79	115,18	0,01%			6,13	115,18	115,18
10.11	93008	m	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		2,00	20,82	41,64	0,00%			2,00	41,64	41,64
10.12	91870	m	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		2,00	12,79	25,57	0,00%			2,00	25,57	25,57
10.13	91934	m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		20,08	26,95	541,19	0,04%			20,08	541,19	541,19
10.14	91926	m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		1.284,04	4,79	6.147,42	0,44%			1.284,04	6.147,42	6.147,42
10.15	91928	m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		1.223,78	8,12	9.940,62	0,72%			1.223,78	9.940,62	9.940,62
10.16	91930	m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		897,78	11,17	10.028,62	0,73%			897,78	10.028,62	10.028,62
10.17	92985	m	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015		80,32	45,20	3.630,59	0,26%			80,32	3.630,59	3.630,59
10.18	93653	unid	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020		14,00	15,59	218,27	0,02%			14,00	218,27	218,27
10.19	93654	unid	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020		11,00	16,24	178,67	0,01%			11,00	178,67	178,67

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Propr.: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

		BASE DE PREÇOS				BASE DE PREÇOS REAJUSTADA				BDI			
		SINAPI 03/2022 Não Desonerado				SINAPI 09/2022 Não Desonerado				23,06%			
		2ª Medição				Medição Acumulada				SAÍDO ATUAL			
		Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
Item	Código	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO										
10.20	93455	unid	1,00	17,58	0,00%		17,58			1,00	17,58		17,58
10.21	101894	unid	2,00	204,82	0,03%		409,64			2,00	409,64		409,64
					2,42%		33.459,96						33.459,96
10.22	91953	unid	4,00	27,81	0,01%		111,25			4,00	111,25		111,25
10.23	91959	unid	2,00	44,05	0,01%		88,11			2,00	88,11		88,11
10.24	91961	unid	2,00	57,27	0,01%		114,54			2,00	114,54		114,54
10.25	92023	unid	22,00	49,38	0,08%		1.086,43			22,00	1.086,43		1.086,43
10.26	91992	unid	27,00	43,01	0,08%		1.161,24			27,00	1.161,24		1.161,24
10.27	91996	unid	10,00	33,19	0,02%		331,89			10,00	331,89		331,89
10.28	92000	unid	57,00	29,39	0,12%		1.675,02			57,00	1.675,02		1.675,02
10.29	COT. 025	m	185,00	59,99	0,80%		11.098,47			185,00	11.098,47		11.098,47
10.30	COT. 026	unid	17,00	239,97	0,29%		4.079,44			17,00	4.079,44		4.079,44
10.31	COT. 027	unid	1,00	215,97	0,02%		215,97			1,00	215,97		215,97
10.32	COT. 028	unid	26,00	287,96	0,54%		7.486,97			26,00	7.486,97		7.486,97
10.33	COT. 029	unid	12,00	143,98	0,12%		1.727,76			12,00	1.727,76		1.727,76
10.34	COT. 030	unid	14,00	161,98	0,16%		2.267,69			14,00	2.267,69		2.267,69
10.35	COT. 031	unid	1,00	143,98	0,01%		143,98			1,00	143,98		143,98

Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE plantae@yaho.com -
Telefone/WhatsApp (79) 99877-0082 CNPJ nº: 19.568.425/0001-20

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Proprietário: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

		BASE DE PREÇOS				BASE DE PREÇOS REAJUSTADA				BDI			
		SINAPI 03/2022				SINAPI 09/2022				23,06%			
		Não Desonerado				Não Desonerado							
		2ª Medição				Medição Acumulada				Saldo Atual			
		SALDO PÓS ADITIVO											
		Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
Item	Código	Unid.	Descrição										
10.36	97595	unid	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020										
		2,00	119,87	239,73	0,02%					2,00	239,73		
10.37	97593	unid	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020										
		10,00	163,15	1.631,48	0,12%					10,00	1.631,48		
				22.635,94	1,64%						22.635,94		
10.38	COTAÇÃO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA PLATIBANDA										
		143,00	1,67	238,49	0,02%					143,00	238,49		
10.39	COTAÇÃO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM (INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA)										
		30,00	41,97	1.259,11	0,09%					30,00	1.259,11		
10.40	COTAÇÃO	M	CABO DE COBRE NU35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
		190,41	37,82	7.201,08	0,52%					190,41	7.201,08		
10.41	COTAÇÃO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO- CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²										
		13,00	15,74	204,64	0,01%					13,00	204,64		
10.42	91872	M	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015										
		65,00	19,58	1.272,52	0,09%					65,00	1.272,52		
10.43	COTAÇÃO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO										
		39,00	7,63	297,61	0,02%					39,00	297,61		
10.44	COTAÇÃO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO- HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"										
		13,00	23,88	310,40	0,02%					13,00	310,40		
10.45	COTAÇÃO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO- HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"										
		12,00	27,87	334,47	0,02%					12,00	334,47		
10.46	96527	m³	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017										
		15,65	130,96	2.049,49	0,15%					15,65	2.049,49		
10.47	COTAÇÃO	M	CABO DE COBRE NU50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
		104,39	53,45	5.579,92	0,40%					104,39	5.579,92		
10.48	COTAÇÃO	UN	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020										
		12,00	29,01	348,14	0,03%					12,00	348,14		
10.49	COTAÇÃO	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017										
		33,00	58,77	1.939,34	0,14%					33,00	1.939,34		
10.50	COTAÇÃO	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS										
		13,00	29,66	385,58	0,03%					13,00	385,58		
10.51	93382	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016										
		15,65	30,72	480,69	0,03%					15,65	480,69		

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO										BASE DE PREÇOS		BASE DE PREÇOS REAJUSTADA		BDI	
										SINAPI 03/2022 Não Desonerado		SINAPI 09/2022 Não Desonerado		23,06%	

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Propri: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO				2ª Medição		BASE DE PREÇOS REAJUSTADA		BDI	
				Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
11,11	COMP. 005	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA FRIA, DN 50 X 25 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	unid	1,00	13,11	13,11	0,00%					1,00	13,11
11,12	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	unid	18,00	7,57	136,23	0,01%					18,00	136,23
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS				11.259,35	0,81%						11.259,35
		BANHEIROS				8.763,63	0,63%						8.763,63
11,13	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	unid	2,00	1.201,92	2.403,85	0,17%					2,00	2.403,85
11,14	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	unid	2,00	549,96	1.099,92	0,08%					2,00	1.099,92
11,15	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	unid	6,00	177,28	1.063,68	0,08%					6,00	1.063,68
11,16	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	unid	6,00	93,83	563,00	0,04%					6,00	563,00
11,17	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	6,00	605,53	3.633,18	0,28%					6,00	3.633,18
		LAVANDERIA				457,18	0,03%						457,18
11,18	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	unid	1,00	457,18	457,18	0,03%					1,00	457,18
		COZINHA				2.003,71	0,14%						2.003,71
11,19	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	unid	1,00	1.201,92	1.201,92	0,09%					1,00	1.201,92
11,20	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	unid	1,00	624,22	624,22	0,05%					1,00	624,22
11,21	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	unid	1,00	162,95	162,95	0,01%					1,00	162,95

Rua Guilherme Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE plantae@yaho.com -
Telefone/WhatsApp (79) 99877-0082 CNPJ nº: 19.568.425/0001-20

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Proprietário: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra:		Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos											
Propri.:		Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos											
Local:		Avenida Sergipe, Nº 1.156 – Centro											
Data:		07/10/2022											
PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO				2º Medição		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
				Quant.	P.Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
11.22	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00	14,62	14,62	0,00%					1,00	14,62
		JARDIM				34,83	0,00%						34,83
11.23	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	1,00	34,83	34,83	0,00%					1,00	34,83
		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				8.510,09	0,62%		3.431,47		3.431,47		5.078,62
11.24	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	5,00	60,77	303,83	0,02%	3,00	182,30	3,00	182,30	2,00	121,53
11.25	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	unid	7,00	516,30	3.614,12	0,26%					7,00	3.614,12
11.26	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES [CAPACIDADE: 36L], RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	unid	1,00	453,10	453,10	0,03%					1,00	453,10
11.27	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	23,55	18,64	439,04	0,03%	12,00	223,71	12,00	223,71	11,55	215,32
11.28	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	50,05	38,94	1.948,82	0,14%	50,05	1.948,82	50,05	1.948,82		102,88
11.29	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	9,21	24,44	225,08	0,02%	5,00	122,19	5,00	122,19	4,21	72,35
11.30	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	9,00	18,09	162,78	0,01%	5,00	90,43	5,00	90,43	4,00	38,31
11.31	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	4,00	19,16	76,62	0,01%	2,00	38,31	2,00	38,31	2,00	30,56
11.32	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	6,00	15,28	91,69	0,01%	4,00	61,13	4,00	61,13	2,00	30,56
11.33	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	2,00	37,21	74,42	0,01%	2,00	74,42	2,00	74,42		

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos										BDI			
Prop.: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos										23,06%			
Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro													
Data: 07/10/2022													
PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Item	Código	Descrição	Unid.	SAÍDO PÓS ADITIVO			%	2ª Medição		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
				Quant.	P.Unid C/ BDI	Valor TOTAL		Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
11.34	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	1,00	37,13	37,13	0,00%	1,00	37,13	1,00	37,13		
11.35	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	4,00	10,74	42,97	0,00%					4,00	42,97
11.36	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	6,00	16,41	98,48	0,01%	4,00	65,66	4,00	65,66	2,00	32,83
11.37	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	6,00	61,10	366,63	0,03%	4,00	244,42	4,00	244,42	2,00	122,21
11.38	89804	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	unid	3,00	27,34	82,02	0,01%	1,00	27,34	1,00	27,34	2,00	54,68
11.39	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	3,00	70,21	210,64	0,02%	3,00	210,64	3,00	210,64		
11.40	COMP. 006	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	3,00	57,10	171,31	0,01%	1,00	57,10	1,00	57,10	2,00	114,20
11.41	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	unid	2,00	8,05	16,11	0,00%	2,00	16,11	2,00	16,11		
11.42	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	unid	3,00	31,77	95,32	0,01%	1,00	31,77	1,00	31,77	2,00	63,54
		FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO				9.746,94	0,70%		7.797,55		7.797,55		1.949,39
11.43	98066	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M. VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	unid	1,00	6.043,80	6.043,80	0,44%	0,80	4.835,04	0,80	4.835,04	0,20	1.208,76
11.44	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	unid	1,00	3.703,14	3.703,14	0,27%	0,80	2.962,51	0,80	2.962,51	0,20	740,63
12.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				233.760,62	16,90%						233.760,63
		CAÇADA				21.101,07	1,53%						21.101,07
12.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20	m²	1,22	983,51	1.199,88	0,09%					1,22	1.199,88

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Proprietário: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos

Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro

Data: 07/10/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO

		BASE DE PREÇOS				BASE DE PREÇOS REAJUSTADA				BDI	
		SINAPI 03/2022 Não Desonerado				SINAPI 09/2022 Não Desonerado				23,06%	
		2ª Medição				Medição Acumulada				SALDO ATUAL	
		SALDO PÓS ADITIVO									
Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
12.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	182,79	108,87	19.901,19	1,44%			182,79	19.901,19
		BANHEIRO				14.414,84	1,04%				14.414,84
12.3	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2	m²	9,86	1.310,13	12.917,84	0,93%			9,86	12.917,84
12.4	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	4,00	374,25	1.497,00	0,11%			4,00	1.497,00
		PERGOLADO FACHADA				181.541,04	13,13%				181.541,04
12.3	COT.032	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM ACM E ESTRUTURA METÁLICA, COM VÃO 16,30M E ALTURA 6,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	169.542,69	169.542,69	12,26%			1,00	169.542,69
12.4	COT.032	CONFEÇÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM ACM 2,00MX2,85M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	11.998,35	11.998,35	0,87%			1,00	11.998,35
		LIMPEZA DE OBRA				4.463,09	0,32%				4.463,09
12.5	COT. 033	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO	mês	4,00	623,91	2.495,66	0,18%			4,00	2.495,66
12.6	COMP.007	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	503,21	3,91	1.967,43	0,14%			503,21	1.967,43
		PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO				1.615,78	0,12%				1.615,79
12.7	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	unid	1,00	247,52	247,52	0,02%			1,00	247,52
12.8	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	unid	3,00	279,37	838,10	0,06%			3,00	838,10000
12.9	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid	10,00	28,50	285,04	0,02%			10,00	285,04
12.10	COT. 034	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) COM CORPO PLÁSTICO E ADESIVO, FOTOLUMINESCENTE MEDINDO 126 MM X 252 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	5,00	27,24	136,18	0,01%			5,00	136,18
12.11	COT. 035	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EXTINTORES DE INCÊNDIO) COM CORPO PLÁSTICO E ADESIVO, FOTOLUMINESCENTE MEDINDO 179 MM X 179 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	27,24	108,95	0,01%			4,00	108,95000
		PAISAGISMO				10.624,80	0,77%				10.624,80
12.12	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	80,98	17,52	1.418,99	0,10%			80,98	1.418,99
12.13	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	unid	16,00	490,52	7.848,26	0,57%			16,00	7.848,26

Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE plantaese@yahoo.com –
Telefone/WhatsApp (79) 99877-0082 CNPJ nº: 19.568.425/0001-20

Obra: Reforma e ampliação da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos		BASE DE PREÇOS		BASE DE PREÇOS REAJUSTADA		BDI
Propri.: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos		SINAPI 03/2022 Não Desonerado		SINAPI 09/2022 Não Desonerado		23,06%
Local: Avenida Sergipe, Nº 1.156 - Centro						
Data: 07/10/2022						

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Item	Código	Descrição	Unid.	SALDO PÓS ADITIVO			2ª Medição		Medição Acumulada		SALDO ATUAL		
				Quant.	P. Unit C/ BDI	Valor TOTAL	%	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
12.14	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	unid	15,00	90,50	1.357,55	0,10%					15,00	1.357,55
						1.383.132,74	100,00%		232.926,37		288.419,50		1.150.206,37
SOMATÓRIA >>													

Valor Global da 2ª Medição: (Duzentos e trinta e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta sete centavos).


Enéias Vidoti
Engenheiro Civil
Crea/RN 1218299991

Relatório Fotográfico

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de Dezembro de 2022.


Ao Ilmo. Sr. Presidente
Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos
Sr. Sérgio Silveira Lima

PLANTAE Serviços e Projetos LTDA, com firma estabelecida na Rua Guilhermino Rezende, 321, Treze de Julho, CEP: 49.020-635, Aracaju/SE, CNPJ 19.568.425/0001-20, representada neste ato pelo sócio o Sr. João Pinto dos Santos, inscrito no CPF sob nº 015.546.845-60, vem por meio deste apresentar Relatório fotográfico dos serviços realizados para esta 2ª Medição, conforme segue:




Remoção itens banheiros, portas, janelas




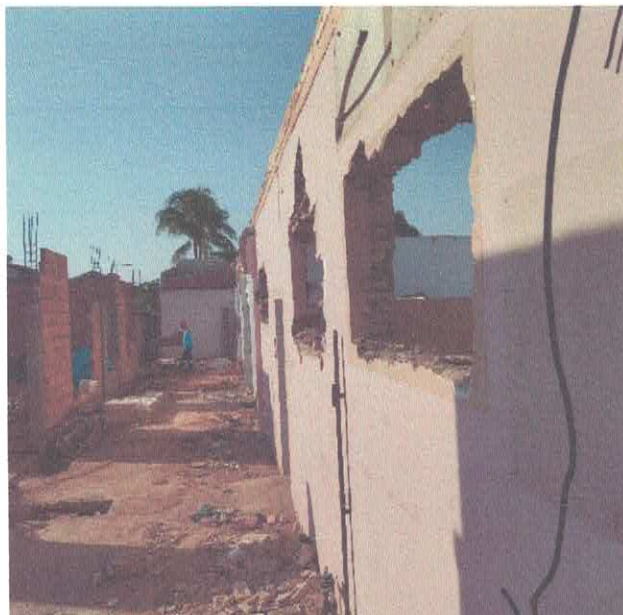

Remoção pilares, vigas, lajes, janelas

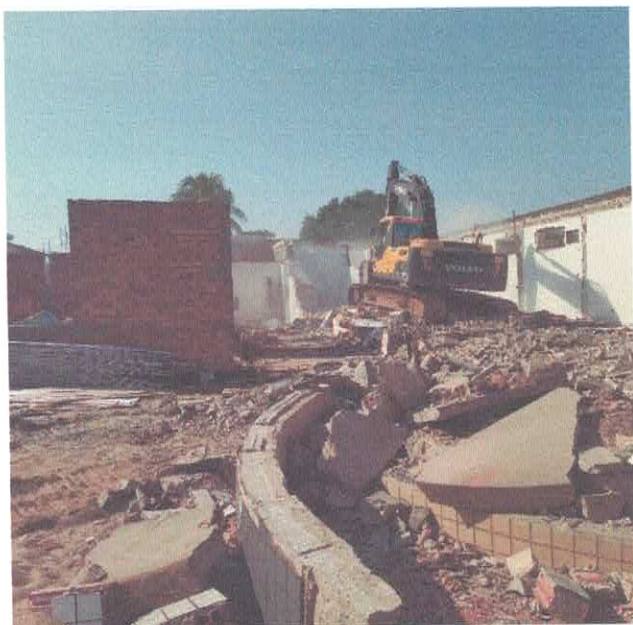

Remoção telhado , Bota fora.

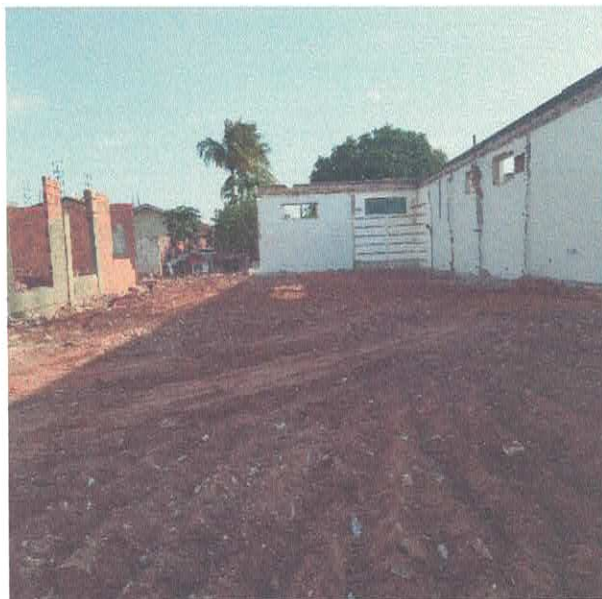

Nivelamento terreno, preparação valas fundação, sapatas.



Deposito, Bloco de coroação, sapata, pilar de arranque com espera, impermeabilização.






Concretagem de pilares, vigas, grauteamento de vergas e contravergas.



Montagem desmontagem de forma, armação de pilares, vigas, alvenaria de blocos cerâmicos 9x19x19, Chapisco.



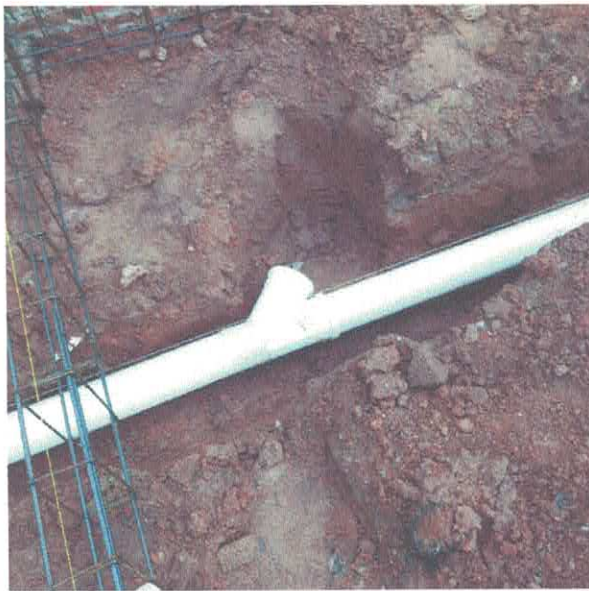

Instalações sanitárias, dutos, joelhos, caixa sinfonada.



Caixa de Passagens, fossa séptica, sumidouro,



Eletrodutos flexíveis corrugados

Desde já antecipamos os nossos agradecimentos;

Nestes termos p. Deferimento;

Enéias Vidoti
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA 1218299991
